


1. 工事進捗状況の説明

農道付替工事


- ・下記の箇所については、現道から約2m嵩上げを行うため、迂回路の設置を予定しており、通行に支障がないように施工を行う。
- ・現在、9月末までの完成予定であったが、追加工事等により日数を要したため、10月末完成予定

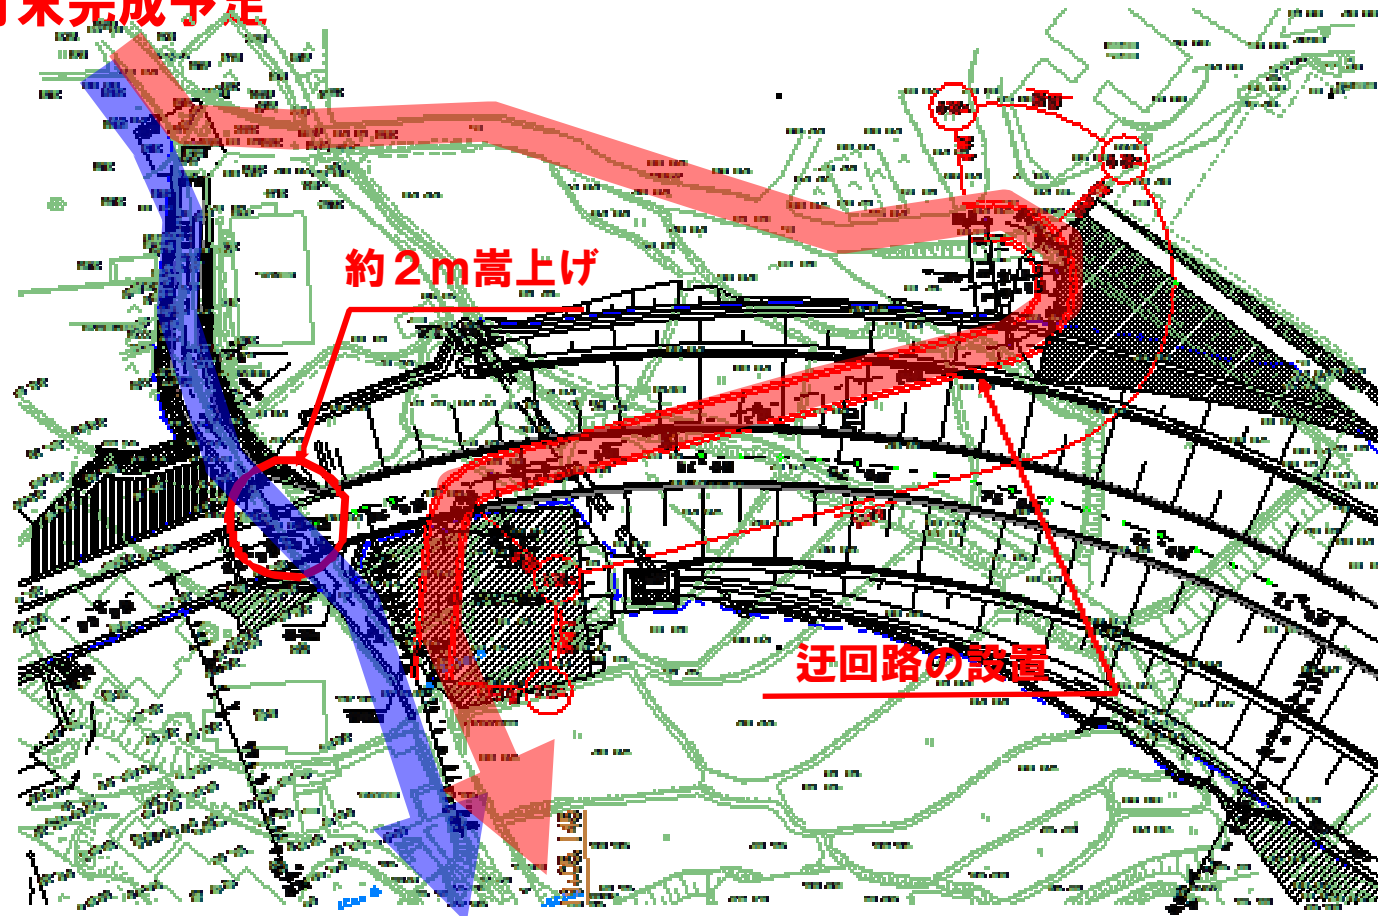

1. 工事進捗状況の説明

8月末までの進捗状況


- ・ 8月末までの工事進捗率 11%
- ・ 現場進入路整備（町道歩道部）
- ・ 仮橋の施工

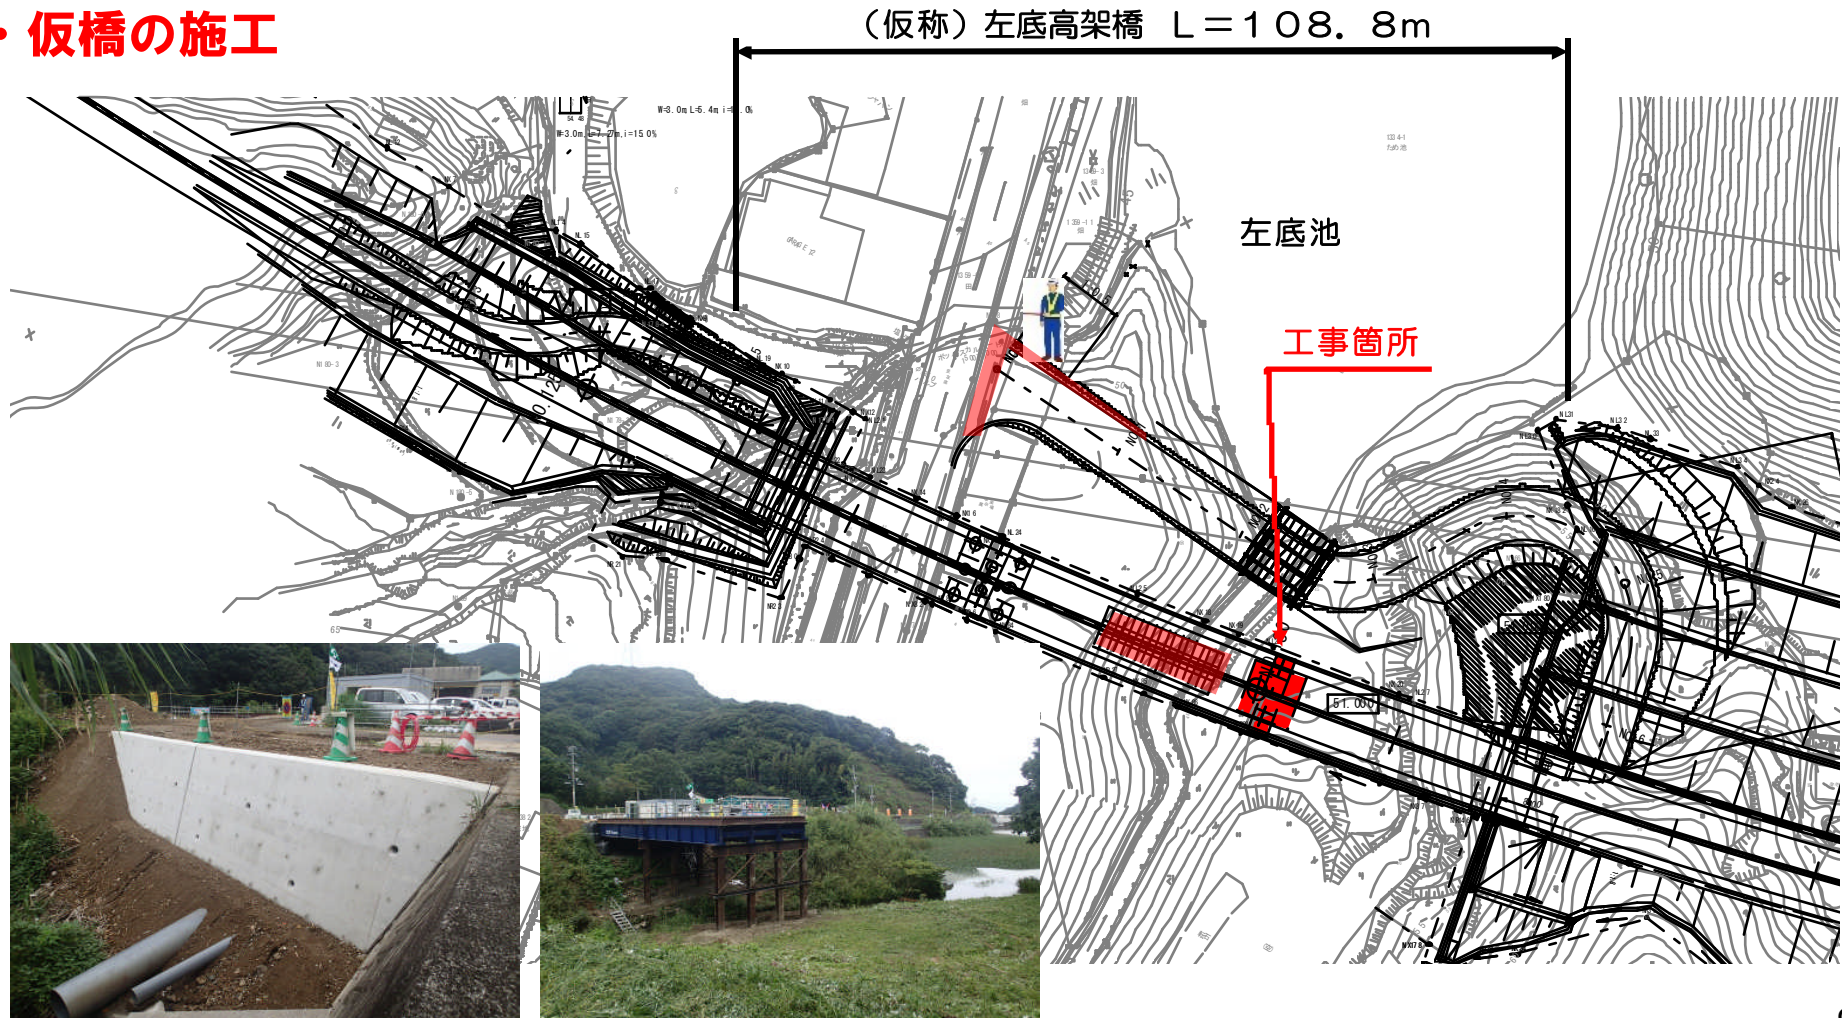

1. 工事進捗状況の説明

9月の工事予定


- ・ 9月末までの工事進捗率 37%
- ・ 仮橋の施工
- ・ P2床掘

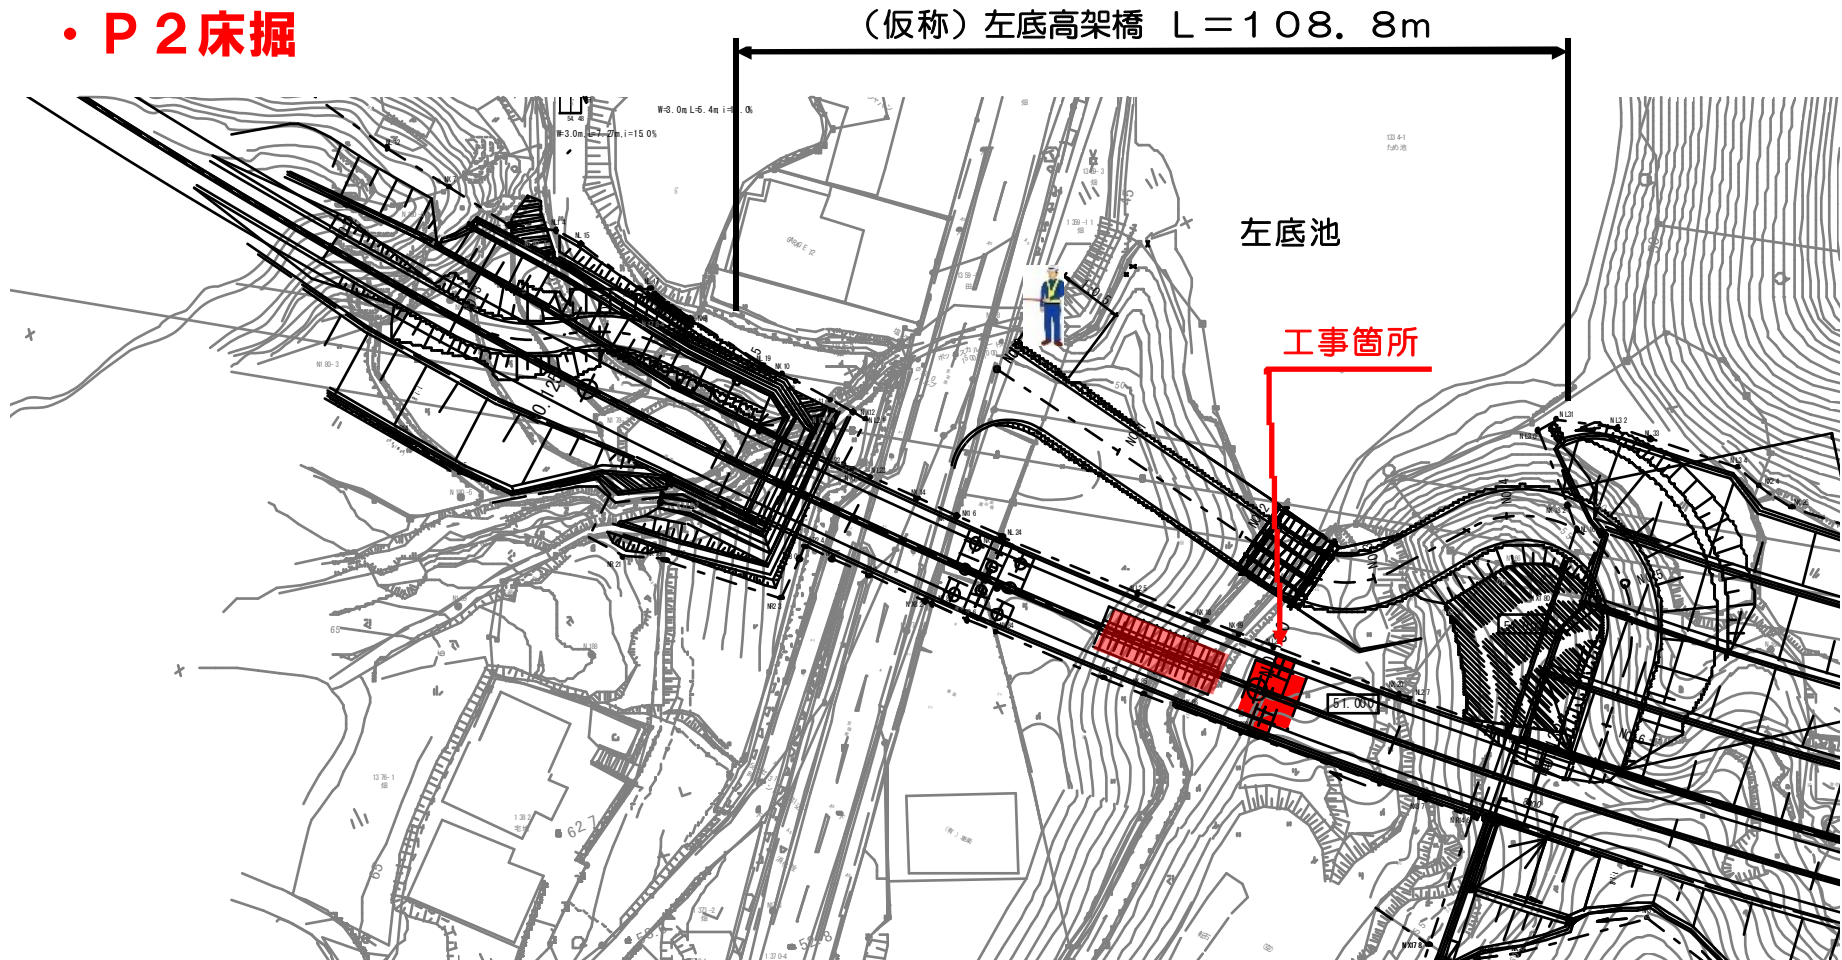

3. 日並交差点安全対策(案)の説明

日並交差点計画平面図

- ・現在、宅地開発が行われており、その前面部を宅地開発と併せて歩道の施工を行う。

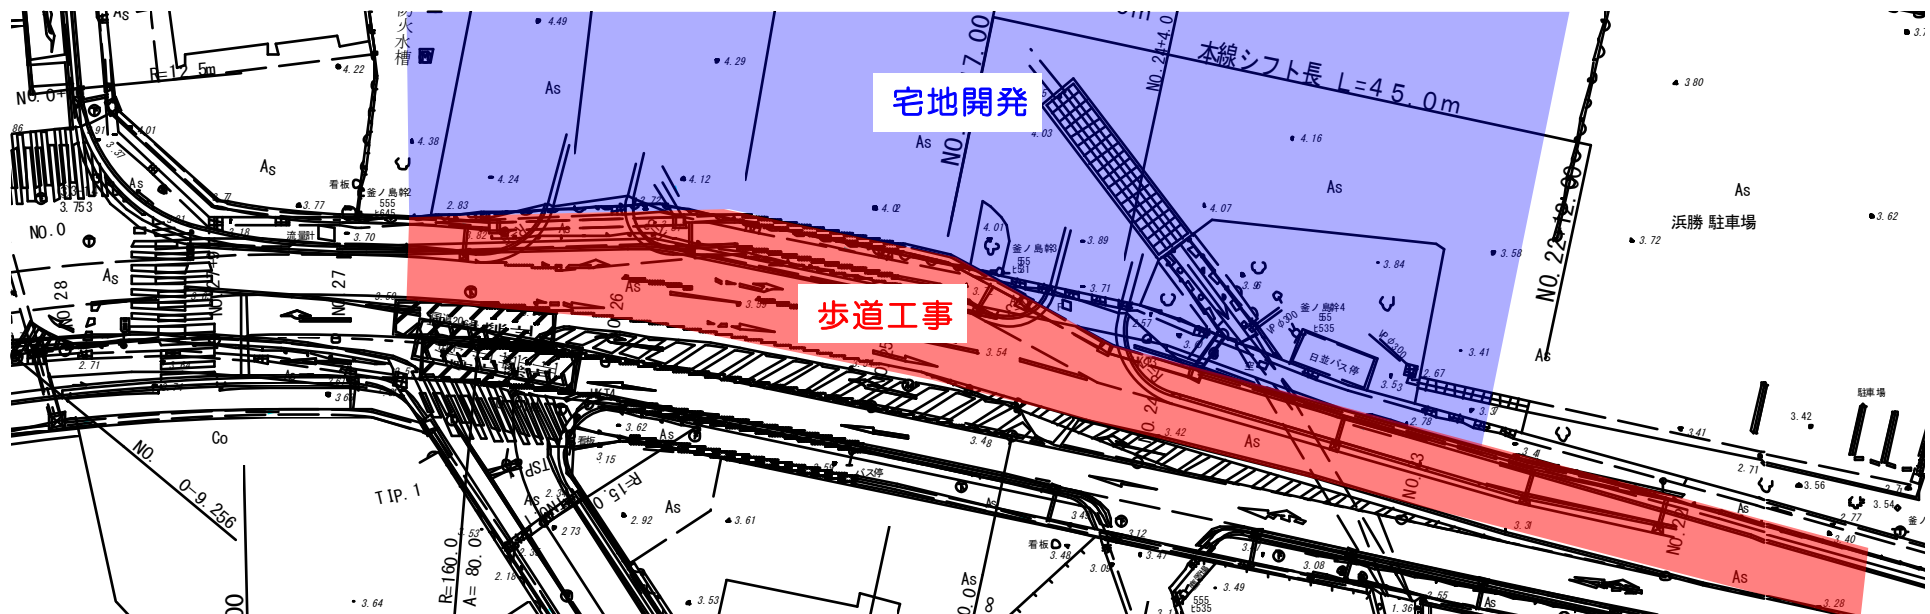

3. 日並交差点安全対策(案)の説明

安全対策協議会の結果

- ・安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。

2. 質疑応答

