


1. 工事進捗状況の説明


7月の工事予定

- ・ 7月末までの工事進捗率 5%
- ・ 仮設道路の施工
- ・ 交通誘導員は工事出入口

付近に施工中 1名配置

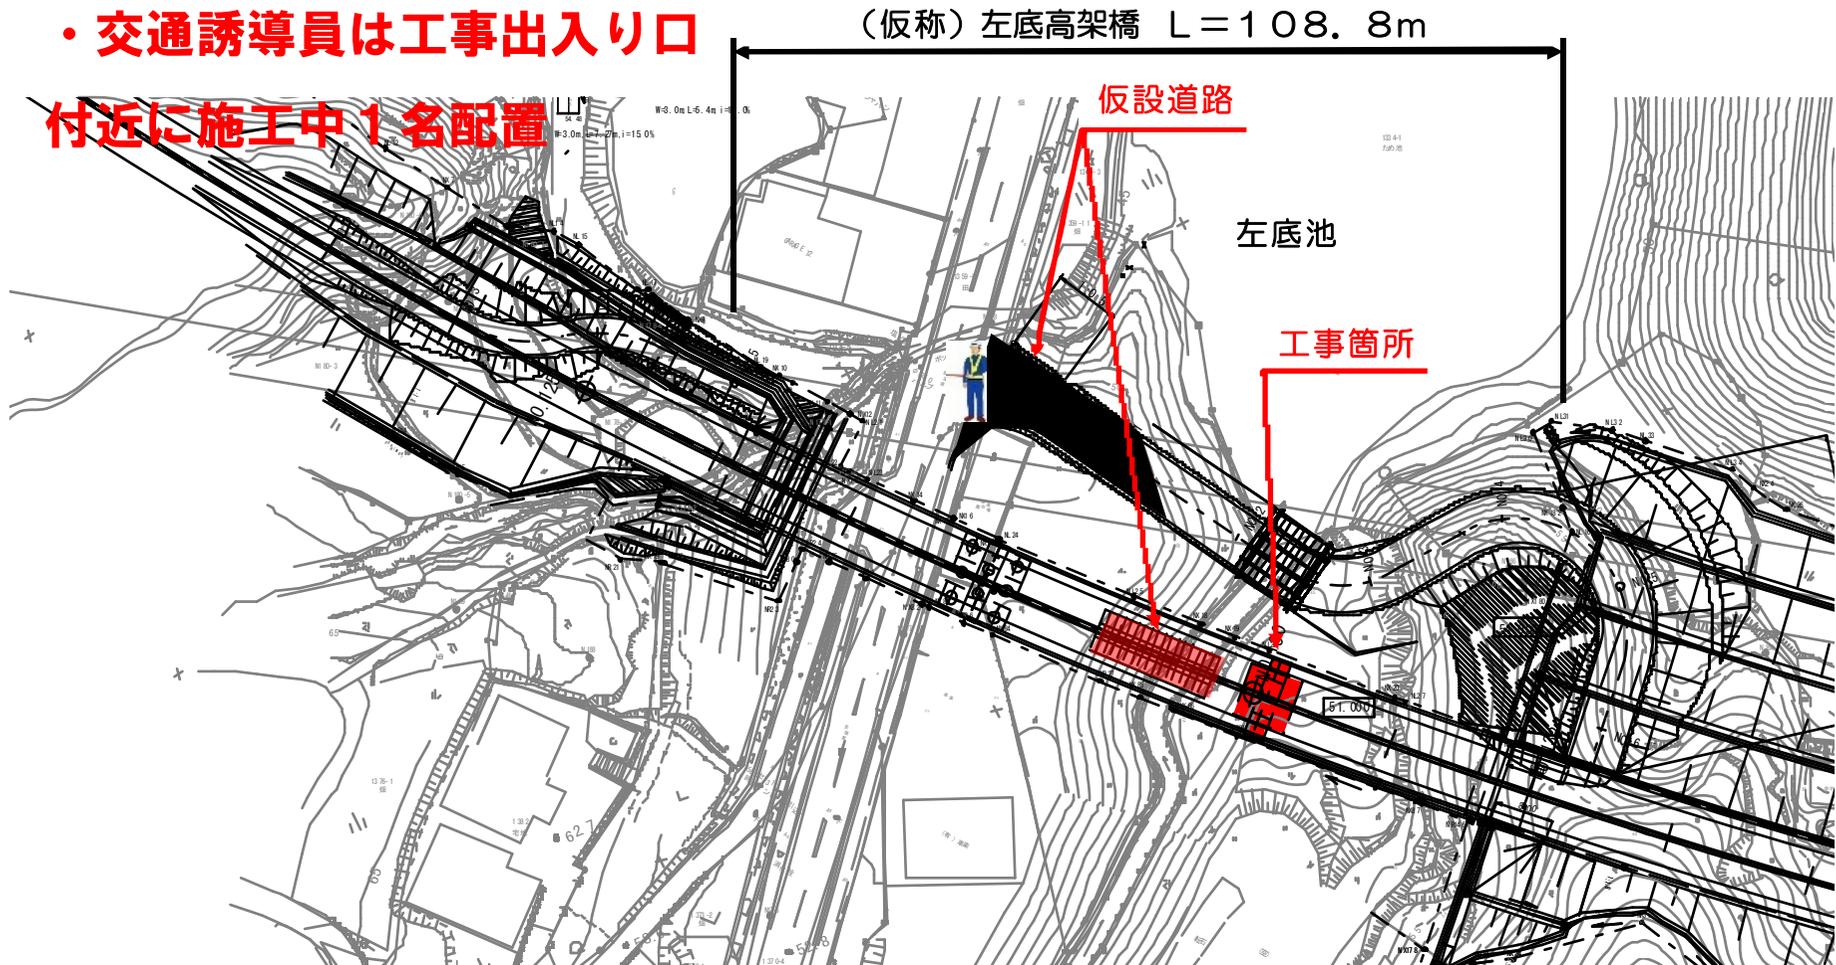

2. 日並側土砂搬出における 安全対策実施状況の説明

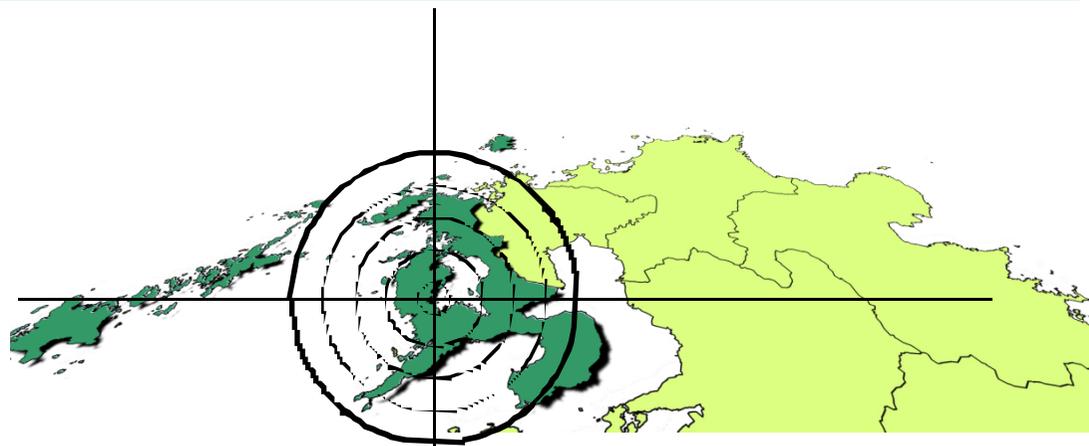


2. 日並側土砂搬出における安全対策実施状況の説明

現在の対策状況

- ・ 現在対策を行っているものについては、問題等も無く苦情等は発生していない。
- ・ その他意見として、就業時間前後のダンプトラックの速度が出ているとの指摘があったため、下記のと通りの対策を実施する。

○就業時間前後でも当工区のダンプトラックと認識してもらうために、**通勤用プラカードの設置**を行う。

作業中プラカード



通勤用プラカード




2. 日並側土砂搬出における安全対策実施状況の説明


残土搬出の状況

- ・(株)平田工業所（子々川）への残土処分は、**7月から(有)九十九興産（西海町）に変更する。**（(株)平田工業所から残土受け入れの一時中止を受けたため）
- ・残土搬出期間は、**7月～12月**を予定している。（このうち約3ヶ月程度）
- ・そのため、残土搬出ルートが町道日並中央線を通ることとなるため、**安全対策は、盛土搬入時と同様の対策**を行う。
- ・盛土材搬入時と同様の対策となるが、次ページのとおり**ビラの更新**を行い、**再配布**を行い周知を図る。（配布先は自治会や学校等）
- ・なお、**土砂搬出時は、盛土材の搬入は行わない。**

2. 日並側土砂搬出における安全対策実施状況の説明

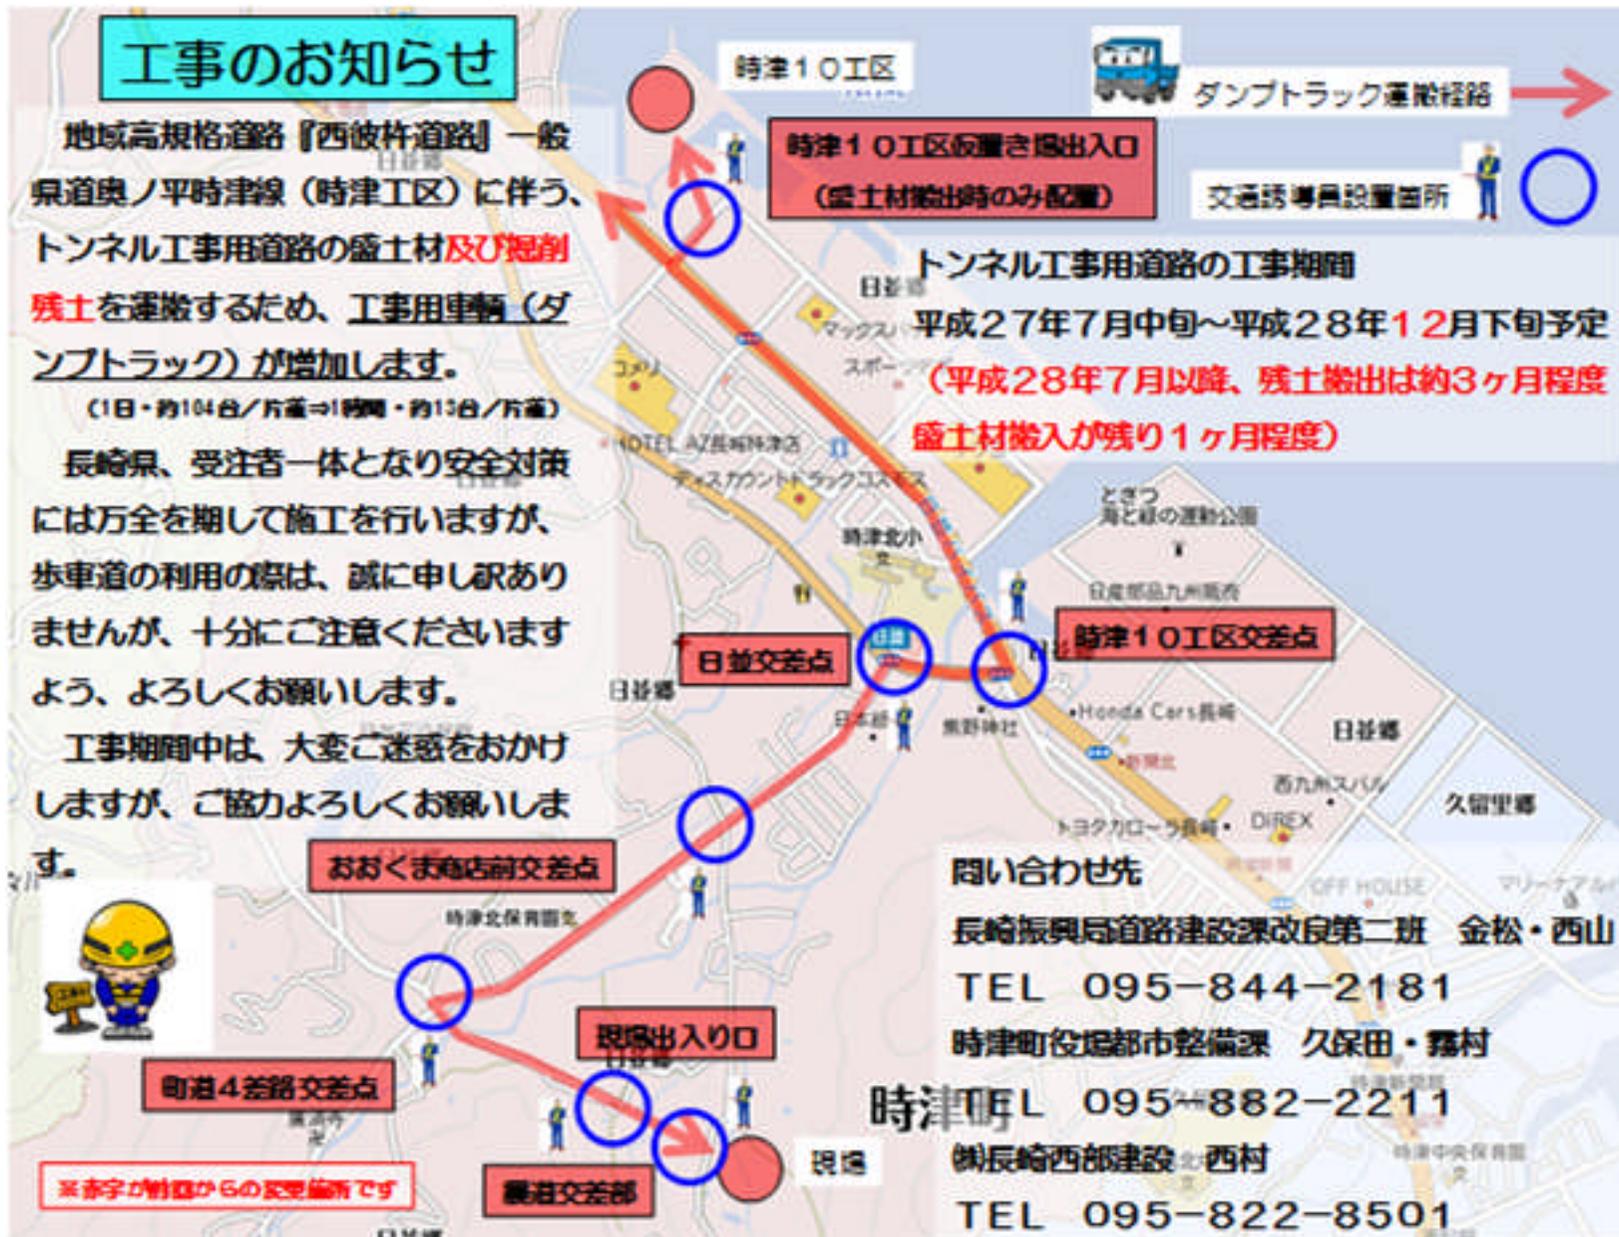


3. 日並交差点安全対策(案) の説明

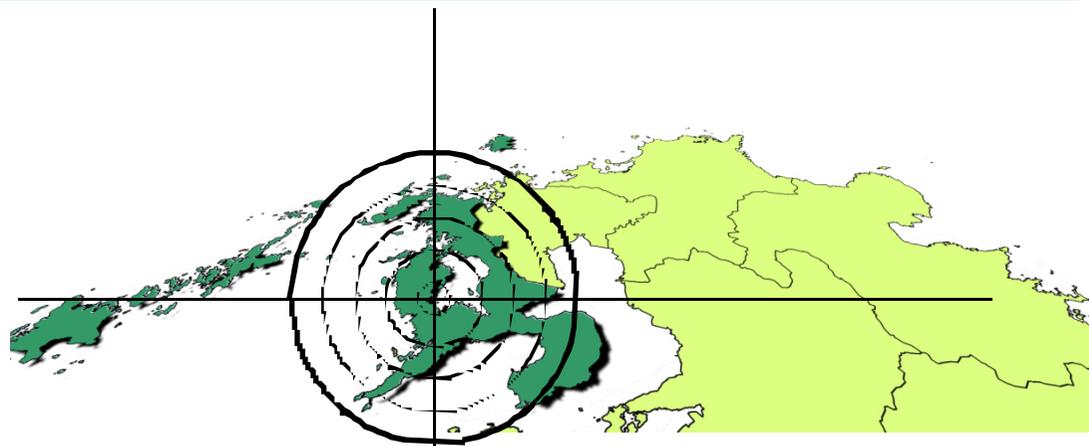

3. 日並交差点安全対策(案)の説明

日並交差点安全対策

- 部分的に歩道の切り替えを行いながら施工を行い、**施工箇所の前後に交通誘導員を2名配置する。**

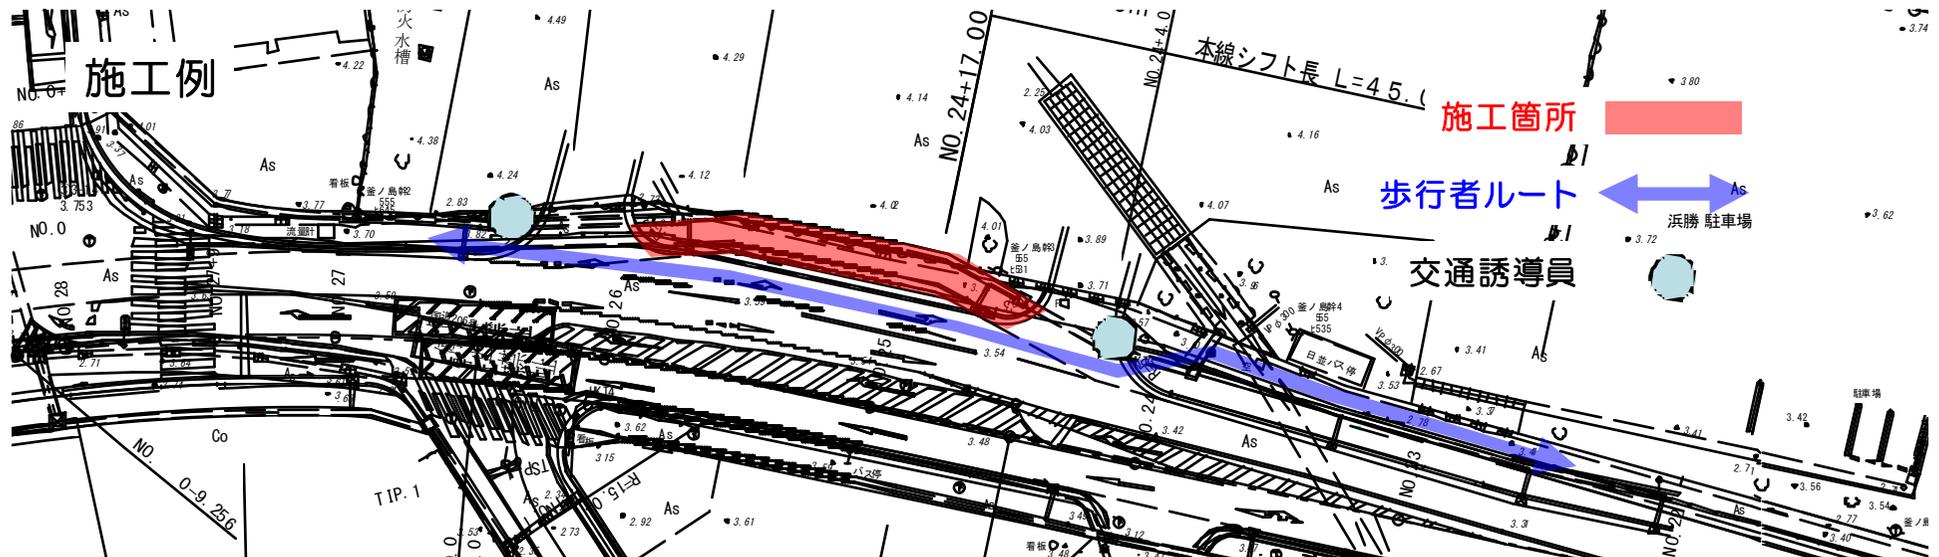

- 地域住民への注意喚起のため、**工事着手前にビラの配布**を行う。(配布先は自治会や学校等)

3. 日並交差点安全対策(案)の説明

安全対策協議会の結果

- ・安全対策協議会の資料については、意見結果を踏まえ、ホームページに掲載する予定です。

4. 質疑応答

