




平成27年度

長崎県公共事業評価監視委員会意見書

平成28年3月18日

長崎県公共事業評価監視委員会

委員長 中村 聖三



平成 27 年度長崎県公共事業評価監視委員会意見書

諮問があった再評価対象事業の「主要地方道諫早飯盛線（土師野尾工区）」については、対応方針（原案）どおり認める。

【参考】

審議経過


- ・ 第 5 回委員会（平成 28 年 3 月 9 日開催）
再評価対象事業の審議

平成27年度 再評価対象事業数一覧(第5回)

平成 28年 3月作成

担当部	担当課	対象事業数	県事業	市町村事業	備考
水産部		0	0	0	
	漁港漁場課	0	0	0	
農林部		0	0	0	
	農村整備課	0	0	0	
	森林整備室	0	0	0	
環境部		0	0	0	
	水環境対策課	0	0	0	
土木部		1	1	0	
	都市計画課	0	0	0	
	道路建設課	1	1	0	
	道路維持課	0	0	0	
	港湾課	0	0	0	
	河川課	0	0	0	
	砂防課	0	0	0	
	住宅課	0	0	0	
合計		1	1	0	

再評価事業位置図

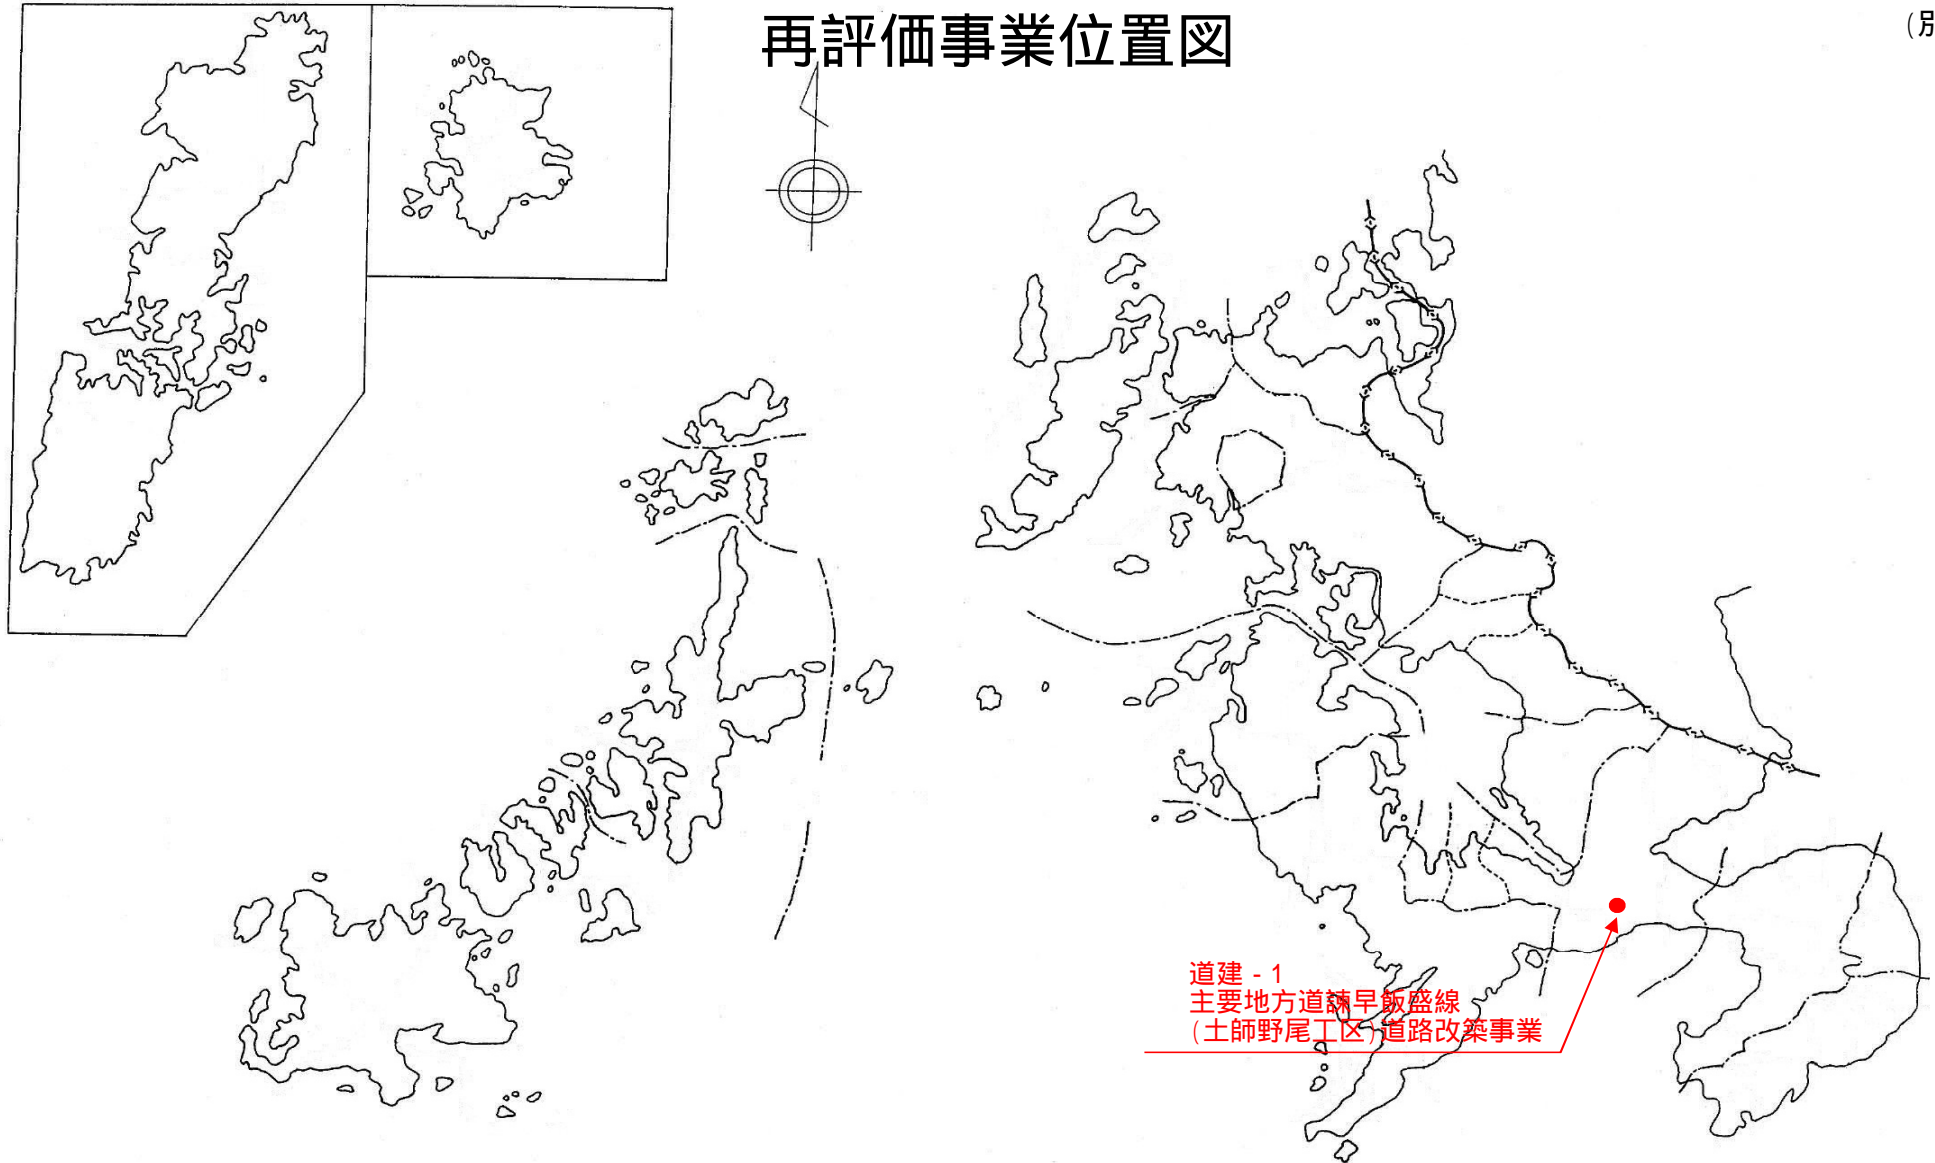

平成27年度 再評価対象事業一覧表(第5回)

平成28年3月作成

整理 番号	事業計画						再評価の 理由	再評価の視点										前回 審議 年度	対応 方針 (原案)			
	事業名	施設名	事業 主体	事業箇所	事業概要	工期		事業費 (億円)	事業進捗の状況及び見込み					上位計画への位置づけ、関連事 業の状況	社会経済 情勢の変化	地元等 の意向	費用対効果分析			コスト削減 及び 代替案立案の 可能性の有無		
						着工			完了	前年度迄 事業費	進捗率	用地 進捗率	H27年 度				H28年度 以降事業				B / C	
						上段：当初 下段：変更			1	(億円)	(%)	(%) 2	(億円)				(億円)				当初 1	現行
道建- 1	道路改築事業	主要地方道諫早飯 盛線(土師野尾工 区)	県	諫早市	延長 L=1.01km 幅員 W=6.5(10.25)m	H24	H30	6.0	5.5	52.4	22 (74)	3.0	2.0	・長崎県総合計画の中で「地域づ くりを支えるネットワークをつくる」 として位置づけられている。 (一)諫早外環状線(諫早イン ター工区)(H20～H29) (一)諫早外環状線(鷺崎～栗 面工区)(H23～H30)	新しい補助制度が創設され たことにより、交付金事業か ら移行を行うため。	「諫早市」から整備 促進の要望あり。	2.31	1.43	・事業費の増加	・掘削残土を他工 区盛土へ流用。 ・代替案の可能性 はない。	-	継続
						H24	H28															

1 2回目以降の再評価の場合、「当初」は「前回」と置き換えている。
2 用地進捗率の上段は「予算ベース」、下段()書きは「契約ベース」である。
