

令和8年度 工事故の発生状況

令和8年9月30日 時点


①月別の事故発生件数

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
R 3	3	4	8	6	4	5	5	8	3	4	4	5	59
R 4	2	5	4	12	5	8	4	7	6	3	5	2	63
R 5	1	4	5	5	7	5	6	7	6	4	1	4	55
R 6	3	5	0	11	7	6	11	2	7	3	6	7	68
R 7	2	8	8	11	8	17	6	9	5	5	5	9	93
R 8	11	3	9	8	17	7							55

(委託業務含) ※水産部漁港漁場課 漁場工事は除く

②月毎の事故発生件数の累計

年度	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
R 3	3	7	15	21	25	30	35	43	46	50	54	59
R 4	2	7	11	23	28	36	40	47	53	56	61	63
R 5	1	5	10	15	22	27	33	40	46	50	51	55
R 6	3	8	8	19	26	32	43	45	52	55	61	68
R 7	2	10	18	29	37	54	60	69	74	79	84	93
R 8	11	14	23	31	48	55						

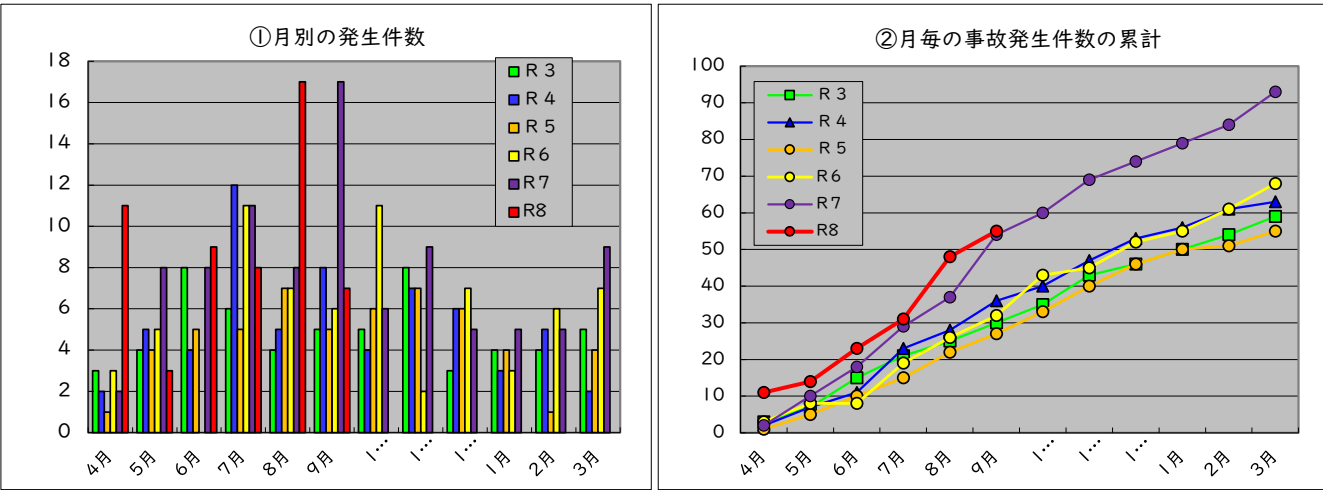

●令和8年度の事故発生の状況

①9月末までの事故発生件数：55件

※内訳：労働災害21件、負傷公衆災害1件、物損公衆災害33件

②重大事故見込み：6件（うち物損公衆災害：1件、負傷公衆災害：1件）

重大事故とは、労働災害で休業4日以上、または重大な公衆災害事故

発生月	事故種別	被災者・物件	確定休業日数 物損復旧日数	工事種別	事故内容
4月	労働災害	60代主任技術者	85日	土木一式	伐採作業中、樹がかざらに絡んでいたことから予想外の方に木が倒れ、枝先が地面に接触し、幹側が道路側に倒れ、浮石・転石の監視をしていた被災者に接触した。その衝撃により、被災者は倒れ、ブロック天端の段差に後頭部を衝突し、出血した。
7月	労働災害	60代作業員	13日	管工事	配管支持金具の切断加工中、電動グラインダーの切断砥石が金具に引っ掛かりキックバックが発生し、その反動でグラインダーが手元から離れ、回転中の砥石が作業者の左大腿部に接触して裂傷を負った。
7月	負傷公衆災害	一般者（原付運転手）	6日	土木一式	除草工事において、作業範囲内にあるトンネルを集草・積み込み用のバックホウで自走移動中に、交通誘導員(自社)が同行していたが、後方から接近してきた原付バイクに気付かず、安全誘導ができずに原付バイクがバックホウに追突し原付運転手が負傷。
7月	労働災害	50代作業員	継続（70日）	土木一式	コンクリート境界杭を法肩に設置するために人力で運搬を行っていた。法肩沿いは勾配が急であったため、一度山の傾斜がゆるやかな場所に移動し、そこから境界杭設置箇所まで斜面を歩こうとした際に、落ち葉や腐葉土に足を取られて転倒。
8月	物損公衆災害	NTTケーブル、電話線	1日	土木一式	碎石の荷卸し完了後、ダンプトラックが荷台を下げながら前進し、上空の光ケーブル及び電話線を損傷した。この事故により、集落の13戸に約1日の影響が生じた。【架空線】
8月	労働災害	40代作業員	継続（30日）	土木一式	小型不整地運搬車で資材運搬後、河川護岸天端で方向転換し戻ろうとした際に被災者が段差に足を取られ、高さ約4mの護岸から転落し、操作者から手を離れた小型不整地運搬車も転落した。

③事故分類

労働災害＋負傷公衆災害 22件

(1位：墜落・転落・転倒7件、2位：その他5件、3位：切れ・こすれ5件、4位：激突され2件
5位：激突1件、飛来・落下1件、挟まれ・巻き込まれ1件)

※その他は、熱中症3件、足の捻挫1件、鉄粉が目に入混入1件

公衆災害（物損）33件

(1位：その他17件、2位：電線・地下埋設物等の切断16件)

④9月発生事故（7件）

発生月	事故種別	被災者・物件	確定休業日数 物損復旧日数	工事種別	事故内容
9月	物損公衆災害	一般車輛の窓ガラス	5日	土木一式	道路買収地内において、バックホウ装着の油圧式草刈機を使用し、除草作業を行っていた際、草刈り機により跳ね上げられた小石が飛散防止ネットの隙間からネットを飛び越えて飛散し広域農道沿いの駐車場に駐車中の右側後部座席の窓ガラスを損傷させた。【飛び石】
9月	物損公衆災害	一般車輛の窓ガラス	16日	土木一式	片側交互規制にて除草工事を行っていたところ、草刈り機による飛び石が飛び石防護ネットの外側に飛散して、通行している車両の後方右側の窓ガラスに衝突、破損させたもの。【飛び石】
9月	物損公衆災害	水道管破損	当日	土木一式	ボックスカルバート設置のため、既設水路の脇を掘削中、深さ1mの位置にあった転石をBHで除去したところ、転石により安定状態を維持していた長崎港湾漁港事務所管理給水管（φ100）の継ぎ手が、水圧により外れ、水が噴き出した。【地下埋設物】
9月	物損公衆災害	架空線切断	復旧未了	土木一式	残土をダンプアップした10tダンプが、荷台を上げたまま走行し現道上の架空線（ソフトバンク）を切断した。【架空線】
9月	物損公衆災害	一般車輛の窓ガラス	復旧未了	土木一式	歩車道境界ブロック車道側の除草を防護柵ネットを使用しながら、施工していたところ、歩道側の駐車場に駐車している車両に飛び石が当たり、窓ガラスにひび割れが生じた。【飛び石】
9月	物損公衆災害	NTT電話線とガイドワイヤの緩み	当日	地質調査	Br資機材(エンジン)を次のBr箇所へ運搬しようと、運搬車へBr資機材を三脚で吊り上げ積込もうとした際、三脚のバランスが崩れて、三脚が傾斜した際、付近のNTT電話線に接触し、NTT電話線とガイドワイヤを緩ませたもの。影響戸数なし【架空線】
9月	労働災害	40代作業員	休業なし	土木一式	丸ノコ(充電式)を使用して、さん木を切断加工する時に切断するさん木を地面に敷木を行い、足と左手で木を固定し右手に丸ノコの体勢で作業を行っていたところ、切断中に丸ノコが節などの固いところで跳ねて、固定していた左手人差し指に接触して裂傷を負った。
